

Entreprise : GÉNÉRALE D'ASSAINISSEMENT / ATM
Adresse : "Les 3 Piliers" 81150 MARSSAC / TARN ENVIRONNEMENT
Tél / Fax : 05-63-55-70-55
Port : 06-83-76-50-66
Mail : albi@generale-assainissement.fr

COMMUNE DE SAINT PAPOUL

DOSSIER DE RECOLEMENT

**DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF**

M. CONSTANT

Adresse : "Les Genières"
11400 SAINT PAPOUL

Par ATM Environnement
Les Trois Piliers
81150 MARSSAC-SUR-TARN
Tél. 05 63 55 70 55

Mr CONSTANT Georges

"Les Linières"

11400 SAINT PAPOUL

Adresse des travaux:

idem

Tél. 06 09 93 61 26

Objet des travaux : Filtre compact Ecoflo 12 EH

DÉSIGNATION TRAVAUX	U	Q
I. TRAVAUX PREPARATOIRES		
Dossier Administratif		
Constitution du dossier administratif (Plan d'implantation sur fond cadastral, aide au remplissage du DIDAA, plan de situation, autorisation de rejet....) avant les travaux pour approbation par les services	Forfait	1
Déplacement		
Forfait déplacement au-delà de 60km	Forfait	1
Vidange		
Vidange de la fosse toutes eaux à la charge du client		
Total Hors Taxes		
II. CANALISATIONS/COLLECTE		
Reprise de sorties		
Reprise pied de mur sous zone engravillonnée diam 100mm pvc (1 sortie WC maison + 3 sorties dépendance)	Unité	4
Reprise sorties aériennes (partie arrière de la maison) diam 40mm pvc	Unité	4
Ventilation primaire		
Fourniture et mise en oeuvre d'un clapet V1	Unité	2
Bac à Graisse		
Fourniture et mise en place d'un bac à graisse 500 litres comprenant rehausse	Unité	1
Canalisation de collecte		
Collecte en gravitaire		
Création d'une canalisation de collecte d'eaux usées en gravitaire comprenant l'ouverture de la tranchée sans évacuation, la fourniture et pose de la canalisation en PVC diam 100 NF (y compris raccords), le calage au grain de riz de remblai, grillage avertisseur et le remblai avec les matériaux du site. :		
En pleine terre => forfait 5 ml	Forfait	1
le ml supplémentaire	ml	30
Sous zone engravillonnée => Forfait 5 ml	Forfait	1
le ml supplémentaire avec 2 passage du mur de soutènement	ml	35
Canalisation aérienne le long du mur arrière de la maison => Forfait 5ml	Forfait	1
le ml supplémentaire	ml	3
Total Hors Taxes		

III. TRAITEMENT et VENTILATION

3.1 Création d'une plateforme d'environ 70m²

Terrassement à la mini-pelle et au mini- chargeur

Forfait

1

3.4 Filtre compact

Filtre compact à massif de coco pour 12 EH en polyéthène (Ecoflo ou similaire), comprenant la fourniture, le transport, le terrassement la mise en œuvre de sable stabilisé (200kg/m3) pour assise et remblaiement périphérique du filtre compact. Remise en place des terres et mise en route du filtre.

unité

1

Ventilation secondaire

Mise en place d'une canalisation jusqu'en pied de mur par tranchée de collecte

ml

16

Remontée de la ventilation secondaire en façade avec collier de fixation et chapeau de ventilation de couleur assortis en PVC rigide, (couleur sable), dm 100 mm ramenée jusqu'au toit.

ml

5

Total Hors Taxes

IV. EXUTOIRE

Canalisation d'exutoire

Création d'une canalisation d'exutoire des eaux traitées en gravitaire comprenant l'ouverture de la tranchée sans évacuation, la fourniture et pose de la canalisation en PVC diam 100 NF (y compris raccords), le calage au grain de riz de remblai, grillage avertisseur et le remblai avec les matériaux du site. :

1

En pleine terre => forfait 5 ml

Forfait

1

le ml supplémentaire

ml

20

Total Hors Taxes

V. REMISE EN ETAT DES LIEUX, RECOLEMENT ET FINITION

Gestion des excédents de terre et gravas du chantier :

Régalement de l'excédent de terre sur le site

Forfait

0

Finition terrain

Brut (Finition à plat avec la lame de la pelle mécanique, ni enfouissement ni enlèvement de pierre et motte)

Forfait

1

Total Hors Taxes

VI. DIVERS

Devis sous réserve de travaux supplémentaires liés à la géographie du terrain (eau, roche, hauteur des sorties maison, ...) nécessitant l'utilisation d'outillage et de matériels spécifiques (brh, chape de lestage ou d'encrage). Ainsi que du résultat de l'étude d'infiltration à la parcelle (confère CGV au verso).

MONTA

Mode de règlement : Au comptant (30% le jour de l'implantation, 70% fin de travaux)

Conditions générales de vente et mentions légales au verso



Vous êtes contents du travail réalisé ?

Venez nous le dire sur nos pages GOOGLE et FACEBOOK !

ACOMPTE

Solde à régler

"Art. D.441-5. douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code du commerce - Pour tout paiement après la date d'échéance, une indemnité de 40 € sera appliquée afin de couvrir les frais de recouvrement."


ATM ENVIRONNEMENT, Les 3 Piliers, 81150 MARSSAC-SUR-TARN - Tél. 05 63 55 70 55

SARL au capital de 15 000 € - RCS Albi 803 856 467 - Décennale : SARL ADM AGENT GENERAL MMA, 47007 AGEN Cedex - N° contrat MMA A140484912

Revised

820

EcoFlo
12 E.H.

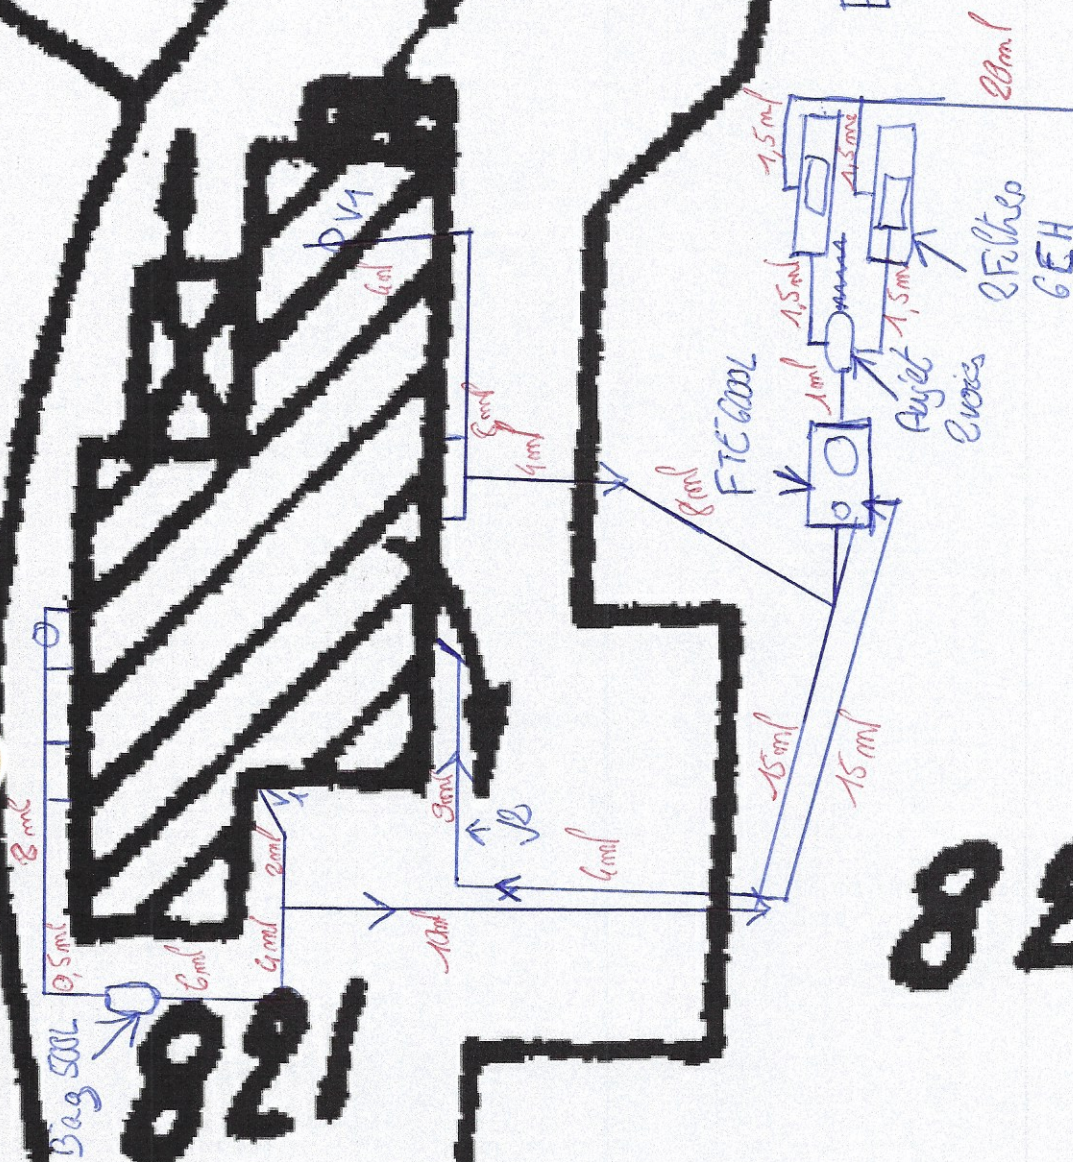



CEMEX Bétons Sud Ouest RUE DU VERSEAU 2 94150 RUNGIS

www.cemex.fr Tel: 05 61 37 36 36 Fax: 05 61 37 36 59
Siège social : 2 Rue du Verseau Silic 423 94583 RUNGIS - SIREN 400151577 - RCS
Crétail- SAS au capital de 28 124 617 EUROS

Client : ATM ENVIRONNEMENT
80914
Chantier : ATM ENVIRONNEMENT
80914
Accès : ATM ENVIRONNEMENT
80914
LES TROIS PILIERS
81150 MARSAC SUR TARNE
Centrale : J914 CARCASSONNE

BON DE LIVRAISON No : **J91400010354**
Numéro BL RMS : 212442123
Date : 01/10/2019 15:15:34
Code Béton : 20162879/10042389-01
Commande : 212442083
Service : L001
Quantité livrée : 4.50 M3

Tel: 06 46 53 88 56 Fax:
E-Mail: upbpa.carcassonne@cemex.com

Appellation commerciale et options

Nuantis StabCouleur



Dés. de norme(1): HCAN
Cl. d'exposition(2): Non définie
Cl. de Teneur en CL:
Addition(7):
Ciment: CEM II/A-LL 42,5 R CE CP2 NF -

Certification :

Cl. de résistance(3): ZZZ (non définie)

D max: 4.0000

Cl. de Consistance(4): Non définie

Min Ciment:

Prestations complémentaires

Quantité Unité Libellé

Adjuvants

Transport **J91400010354**

Louageur :

Nom de chauffeur : BORREL

Véhicule : 13211922


Zone de transport : 0

Immatriculation : RMS-DUMMY J914

Zone de distribution :

P.O.

Commentaire :



Retour béton:

NON :

Produits irritant pour la peau et les yeux, et pouvant provoquer une allergie cutanée et/ou des brûlures, voir précautions d'emploi article VIII du verso.										
Heures	1 ^{re} gâchée	Arrivée chantier	Début d'installation	Fin d'installation	Début vidange ou pompage	Fin de vidange ou pompage	Départ chantier	Retour centrale	Convenue	Limite d'utilisation (8)
	15:15:34									17:15
(1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées - BCPE : Béton à Composition Prescrite résultant d'une étude réalisée par le client - BCPN : Béton à Composition Prescrite définie dans une norme (NF DTU 21) - HCAN : Appellation réservée aux produits non couverts par le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN - BIPS : Béton d'ingénierie à propriétés spécifiées - BICP : Béton d'ingénierie à composition prescrite. (2) La classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm. (3) Contrôle de la résistance effectué sur cylindres. (4) Consistance : S1 (10 à 40 mm) S2 (50 à 90 mm) S3 (100 à 150 mm) S4 (160 à 210 mm) S5 (sup. 220mm) SF1 (550 à 650 mm), SF2 (660 à 750 mm), SF3 (760 à 850 mm). (5) La valeur du coefficient k d'une addition est sélectionnée conformément à l'article NA 5.2.5.2.2 de la norme NF EN 206/CN. (6) Dosage minimum lorsque spécifié par le client dans le cas des BPS et dosage nominal dans le cas des BCP. En l'absence d'une composition spécifiée par le client-prescripteur résultant d'une étude réalisée par lui sous sa responsabilité, les BCP correspondront à la définition restrictive donnée à l'article article 3.3 de la NF DTU 21 P1-2, à savoir 250 kg/m3 de ciment = 8 MPa; 300 kg/m3 = 12 MPa; 350 kg/m3 = 16 MPa 400 kg/m3 = 20 MPa. (7) Additions coléaires (L), Cendres volantes (V), Cendres volantes humides (VH), Additions siliceuses (U), Laitiers moulus (S), Fumées de silice (D), Métakaolin Type A (M). (8) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la première gâchée. (9) Tout ajout d'eau sur chantier, à la demande du client, rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN et le dit béton n'est plus certifié NF.						AJOUTS (9) demandés par le client ou son représentant et effectués suivant ses instructions Nature _____ Quantité _____		Nom du Chauffeur BORREL SIGNATURE Le chauffeur a reçu l'ordre du fournisseur de n'ajouter ni eau, ni autres ingrédients. Livraison réceptionnée, pour le client. Nom du Réceptionnaire _____ SIGNATURE		







