

Entreprise : .SARL.BERNARD.CONSTRUCTION

Adresse : 40, Rue de Dunkerque 11400 CASTELNAUDARY

Tél / Fax : .04.68.60.02.15.....

Port :

Mail : .sarlbernardc@orange.fr..

COMMUNE DE ..MAS.STES.PUELLES.....

DOSSIER DE RECOLEMENT

**DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF**

Mme...NOVION.....

Adresse : 3023, Chemin de la Tour..
La Ganguise.....
11400...MAS.STES.PUELLES...

Filière préconisée : *Micro station Homoblock Biorock SEH*

EXEMPLE :

*FOSSE TOUTES EAUX DE 3 000 LITRES AVEC PREFILTRE INTEGRE,
SUIVIE D'UN FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE DE 25 M²*

Dossier :

- Photos du chantier (si possible)
- Fiche technique de la filière préconisée
- Fiche technique des différents regards du filtre
- Attestation du KIT FASVD
- Pièces à produire par l'entreprise lors du contrôle de réception :
 - a) Document et bon de livraison de la fosse toutes eaux et (ou) bac à graisse
 - b) Bon de pesée ainsi que provenance des différents matériaux constituant les ouvrages, à savoir : sable filtrant, sable de calage, gravier 20/40 (l'entreprise veillera à ce que les copies de ces documents soient visibles)
 - c) Courbe granulométrique et teneur en CaCO₃ du sable filtrant
 - d) Bon de vidange des ouvrages existants ainsi que lieu de dépôtage
- Conseil d'utilisation et d'entretien
- Assurance décennale
- PV de réception







P-BION0024


MONOBLOCK-3-800-5 Sortie gravitaire Noire



968:2018030000792

Machine 2 - Cavite 1

Plan de Catépinage Tme NOUION

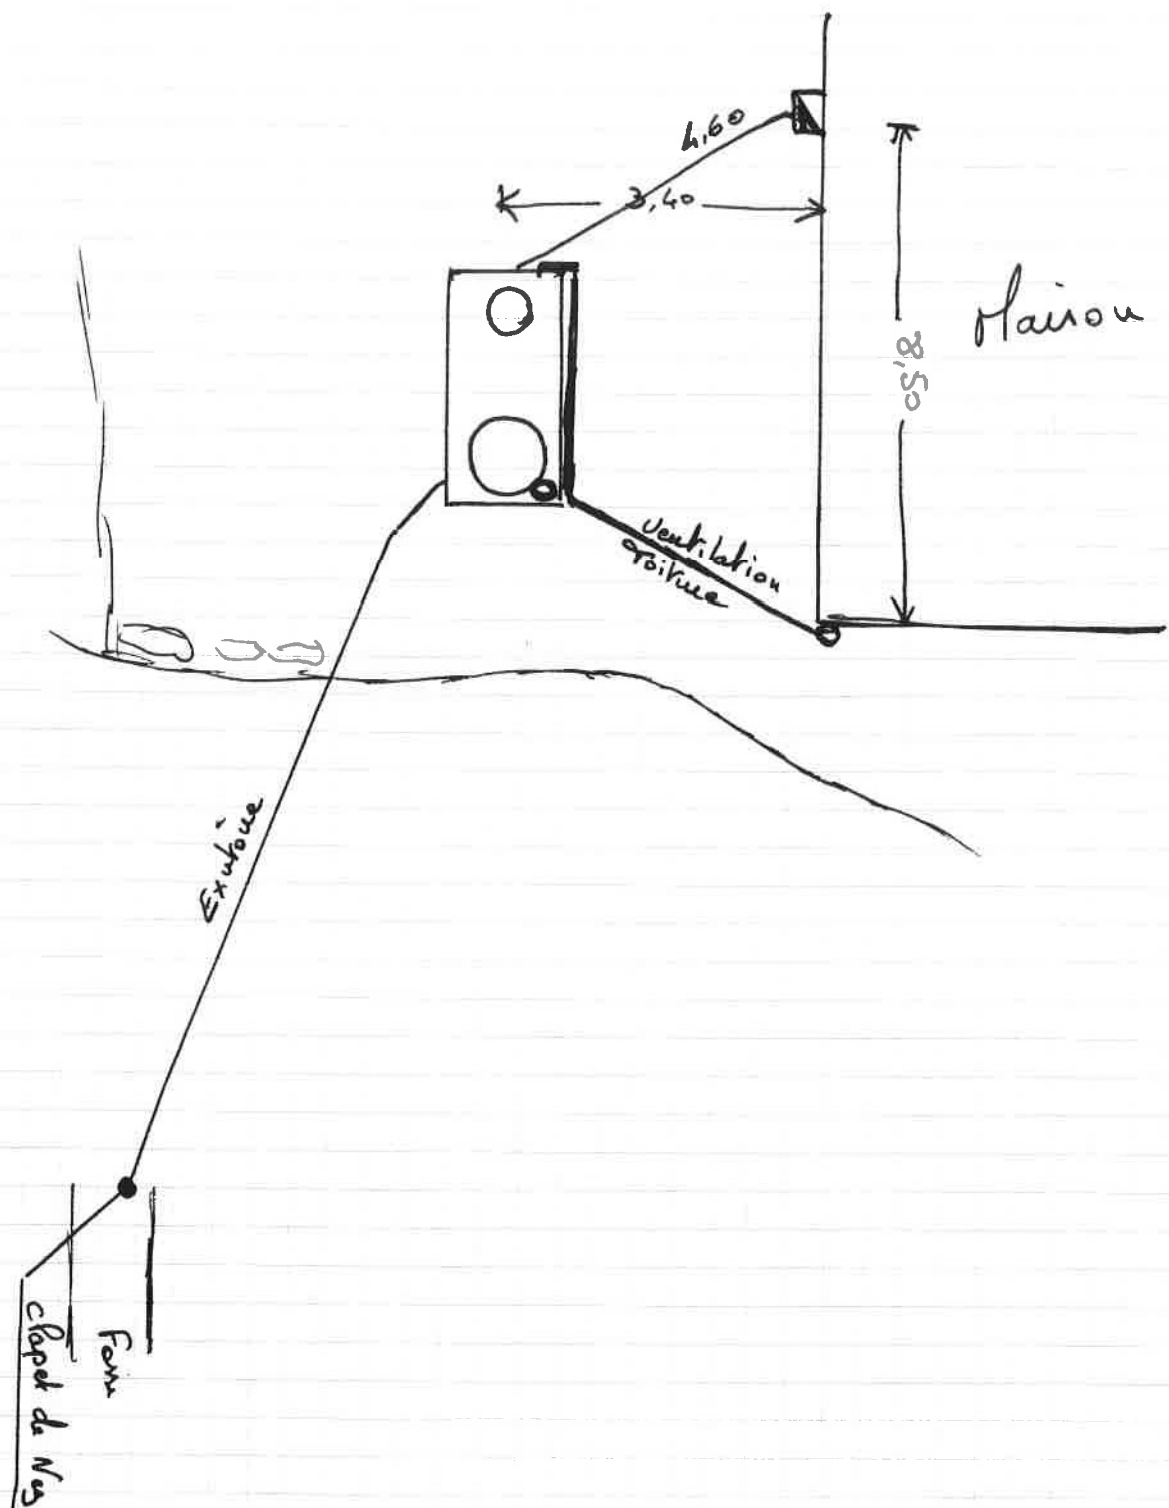



BIOROCK

assainissement non collectif

GUIDE DESTINE A L'USAGER

MONOBLOCK-3-800-5

TRAITEMENT PRIMAIRE 3m³

CAPACITE JUSQU'A 5 E.H.



AGREMENT N°2017-002-ext03

BIOROCK® SARL

4-5 Zone d'Activités Economiques
Le Triangle Vert
L-5691 ELLANGE – Luxembourg

CE

17

N° Ddp :

20170401

EN 12566-3+A2



S.A.R.L. Bernard Construction

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

40 Rue de Dunkerque - 11400 CASTELNAUDARY

Tél : 04.68.60.02.16 - Fax : 04.68.60.07.69

Tél : 04.68.60.02.16 - Fax : 04.68.60.07.69

SARL au Capital de 8 000,00 € - N° Siret : 43538759200015 - APE : 4399C - FR73435387592

Facture		Madame NOVION Véronique 3023 Chemin de la Tour La Ganquise 11400 MAS SAINTES PUELLES
CASTELNAUDARY, le 29 juin 2018		
Référence : 18/048 Du : vendredi 29 juin 2018		
Objet:		

Désignation	Quantité	Un	Prix Unit.	Montant H.T.
<u>ASSAINISSEMENT MONOBLOCK 3000 L D800</u> <u>BIOROCK 5 EH SORTIE BASSE (H4 FILIERE)</u>				
Implantation et traçage de la filière	1,00	E	50,00	50,00
Tranchée dans la terre (terre laissée sur place) conduite et ventilation (sauf roc)	17,70	MI	10,50	185,85
Terrassement pour micro station terre laissée sur place (attention environ 13 m3 en place soit foisonné 17 m3) sauf roc	1,00	E	255,00	255,00
Réalisation d'une forme de grain de riz en fond de terrassement pour pose microstation	1,00	E	148,50	148,50
Pose et fourniture microstation Monoblock Biorock 5EH	1,00	E	4 373,40	4 373,40
Remplissage périphérique avec grain de riz	1,00	E	799,00	799,00
PVC D100 en tranchée	11,20	MI	15,00	168,00
Pièces spéciales PVC D100	3,00	U	15,70	47,10
Clapet de nez à l'extrémité du tuyau	1,00	U	117,85	117,85

Désignation	Quantité	Un	Prix Unit.	Montant H.T.
PVC pour ventilation en tranchée	7,00	MI	15,00	105,00
Pièces spéciales PVC D100 ventilation	4,00	U	15,70	62,80
PVC D100 beige en façade fixé avec collier	6,30	MI	37,00	233,10
Extracteur éolien	1,00	U	144,80	144,80
Calage au grain de riz des canalisations	18,20	MI	12,50	227,50
Grillage avertisseur dans tranchées	18,20	MI	2,31	42,04
Remplissage des tranchées avec terre et régalaage de l'ensemble des terres	1,00	E	300,00	300,00
Vidange fosse actuelle	1,00	E	240,00	240,00
<u>Remarque :</u> La forme de pose pour poser la microstation a été faite avec de la chape à la place d'un grain de riz à cause des pierres. La plus value qui est de 159.50 E TTF vous est offerte à titre commercial				


 Payé par chèque
 A.R.L. Bernard Construction
 ENTREPRISE GÉNÉRALISTE DU BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
 40, rue de l'Industrie - 31450 CASTELNAUDARY
 Tél. 04 68 60 07 16 - Fax 04 68 60 07 69
 SARL Bernard Construction
 S.A.R.L. au capital de 400 000 € - 40 000 000
 R.C.S. Castelnau-Mirandol - Siret 403 185 000 000 000 000

Total H.T.	7 499,94
TVA ₄ : 10,00 %	749,99
Total T.T.C.	8 249,93
Net à payer (Euro)	8 249,93

Règlement : A réception de facture

Pénalité de retard : 1.5 %.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement

Comptant : 8 249,93 €
